


# Мониторинг исполнения федеральных целевых программ региона

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"

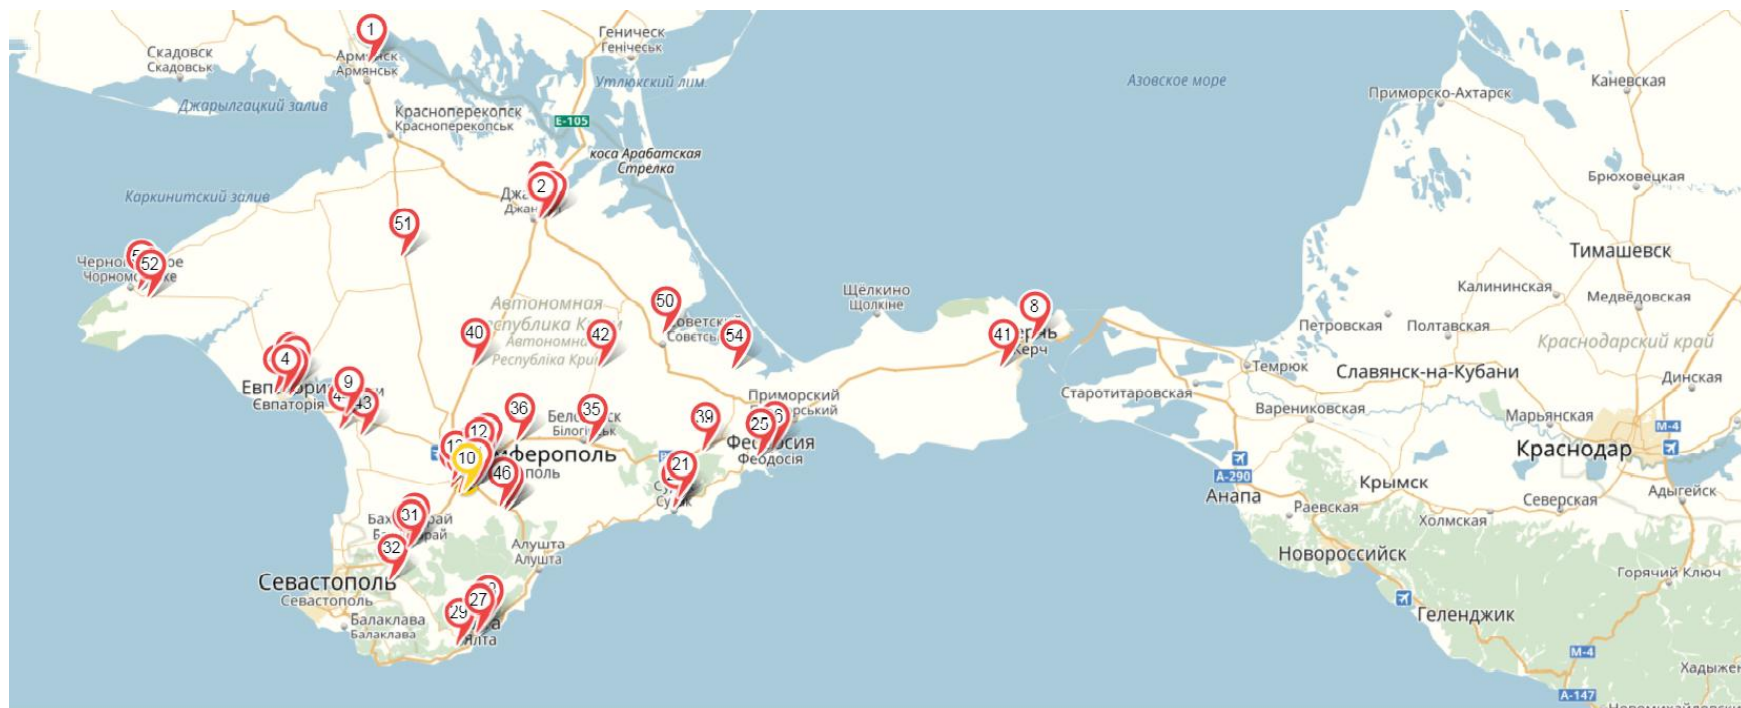

# АСК «ММЦ» - современное цифровое решение для эффективного управления и контроля над проектами ФЦП

- контроль и надзор за объектами проектирования, строительства и реконструкции в режиме 24/7
- мониторинг исполнения регламентов, сроков, этапов, объемов со сбором обосновывающих и результирующих документов и материалов

## Масштаб проекта

|        |                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300    | объектов строительства и реконструкции                                                           |
| 200    | подрядных организаций                                                                            |
| 12     | ведомств – государственных распорядителей бюджета                                                |
| 1 трлн | совокупный объем финансирования проектов в рамках ФЦП, под задачи которой создана данная система |

## Особенности системы



облачный сервис с доступом в информационную систему через web-клиент



персональные личные кабинеты с индивидуальным уровнем доступа



доступ к актуальной информации 24/7 в режиме онлайн



автоматическая аналитика и статистика



онлайн трансляция потокового видео со строительных объектов



обновление функционала исходя из «полевых» потребностей раз в месяц

# Как это работает – от регулярной отчетности от подрядчиков к аналитике для руководителей



# Главная страница портала – Рабочий стол пользователя

Быстрый доступ к документам и информации по объектам и личным задачам

Главная страница | Рабочий кабинет | Еще

Азарова Анна | Выход

Мониторинг исполнения федеральных целевых программ региона

Мои действия

Стартовая страница

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ | РАБОЧИЙ КАБИНЕТ | РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ (ЕЩЕ) | ДОЛГОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Реестр объектов строительства

Адрес или наименование объекта

Все объекты | Директивные планы | Объекты предпроектной стадии

Объекты ГКУ УКС | Объекты финансирования | Объекты долевого строительства

Реестр документов

Госконтракты ПИР | ППЗУ | Разрешения на строительство | Госконтракты СМР | Экспертиза ПСД | Разрешения на ввод | Соглашения на субсидии | Утверждение ПСД

Перейти на "Карту объектов учета"

Календарь задач

Месяц

октябрь | ноябрь 2016 | декабрь

| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |    |    |    |    |

Переход к разделу  
«Государственные программы»

# Ведение реестра и данных по мероприятиям в карточках

## Перечень мероприятий ФЦП

Контроль ▾ Государственные программы ▾ Объекты ▾ Отчеты ▾

### Мероприятия

Поиск

Найдено — 26 Таблица ▾

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                                                                                                                        |
| <a href="#">Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (парк им. Фрунзе), Республика Крым</a>                                                    |
| <a href="#">Водоснабжение сел Резервное и Гончарное, 1-я очередь</a>                                                                                                |
| <a href="#">Магистральный газопровод Краснодарский край - Крым</a>                                                                                                  |
| <a href="#">Многосторонний автомобильный пункт пропуска Джанкой, Джанкой Республика Крым</a>                                                                        |
| <a href="#">Многосторонний автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, Армянск, Армянский городской совет, Республика Крым</a> |

Карточка мероприятия

### Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым

городской округ Евпатория

мероприятие

Паспорт Документы КС-2 КС-3 КС-6А Объекты в парке Финансирование Получения

**Описание объекта**

Главный распорядитель бюджетных средств: Минэкономразвития России

Состояние мероприятия: В работе

Направление и блок мероприятия: Направление по развитию инженерной инфраструктуры и водообеспечения (Мероприятия по бере...

**Обосновывающие и утверждающие документы**

Нормативно-правовой акт: Не требуется

Служебная записка о внесении изменений в программу: Не требуется

**Контроль исполнения мероприятия**

|                                                                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП( <a href="#">Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым</a> )   | 11.10.2016   |
| Градостроительный план земельного участка( <a href="#">Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым</a> ) | 19.09.2016   |
| Техническое задание на ПИР                                                                                                                                                  | не получен   |
| Кадастровый паспорт                                                                                                                                                         | Не требуется |
| Свидетельство о праве собственности                                                                                                                                         | Не требуется |

**Участники**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Участник мероприятия | <u>ООО "ТАРИТ"</u>         |
| 2. Куратор мероприятия  | <u>СКС Республики Крым</u> |

Тестовый\_1 Подразчик один с 01.09.2016  
Оператор ММЦ с 01.09.2016

Последняя версия Отчета о ходе реализации мероприятий.

Отчет заполняется Подрядчиком по объекту строительства и отображается в связанной карточке мероприятия

### Контроль исполнения мероприятия

Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП( [Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории \(1-я очередь - парк им. Фрунзе\), Республика Крым](#) )

Градостроительный план земельного участка( [Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории \(1-я очередь - парк им. Фрунзе\), Республика Крым](#) )

Техническое задание на ПИР не получен

Кадастровый паспорт Не требуется

Свидетельство о праве собственности Не требуется

Блок содержит все наиболее важные для контроля документы

# Ведение данных по объектам строительства, связанным с мероприятиями

## Карточка объекта

## Перечень объектов

| Контроль ▾                                                                                                                     | Государственные программы ▾ | Объекты ▾      | Отчеты ▾ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|
| <b>Реестр объектов</b>                                                                                                         |                             |                |          |
| <input type="text" value="Адрес или наименование"/>                                                                            |                             |                |          |
| Найдено — 30    Таблица ▾                                                                                                      |                             |                |          |
| Наименование                                                                                                                   | Дата начала                 | Дата окончания |          |
| <a href="#">Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым</a> |                             |                |          |
| <a href="#">Водоснабжение сел Резервное и Гончарное, 1-я очередь</a>                                                           |                             |                |          |
| <a href="#">Высоковольтная линия 330 кВ Западно-Крымская - Севастополь (схема будет уточнена проектом)</a>                     |                             |                |          |
| <a href="#">Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Выжестеблиевская (Тамань)</a>                               |                             |                |          |
| <a href="#">Магистральный газопровод Краснодарский край - Крым</a>                                                             |                             |                |          |

Представление связанной информации:  
последняя версия отчета о ходе реализации мероприятий отображаются в карточке мероприятия по связанному объекту строительства

**Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым**

ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Паспорт    ТЭП    Документы    Ход строительства    КС-2/ КС-3/ КС-6А    График    Арбитраж    Исполнительная документация    Финансирование    Получения

**Финансовые показатели**

Мероприятие: Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым

Программа: Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"

**Основные документы**

Закончение о соответствии: не получен

Закончение экспертизы проектной документации: не получен

Информационная справка о состоянии объекта: [6/н](#) 14.09.2016

Проектная декларация: не получен

**Контроль исполнения мероприятия ФЦП**

Градостроительный план земельного участка: [RU83304000-1](#) 19.09.2016

Кадастровый паспорт: Не требуется

Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП: [6/н](#) 11.10.2016

Свидетельство о праве собственности: Не требуется


Техническое задание на ПИР: не получен

**Участники**

1. Застройщик: [ООО "ТАРАНТ"](#) Тестовый\_1 с 01.09.2016

2. Субподрядчик: > Подрядчик один

Местоположение на карте [Открыть карту](#)

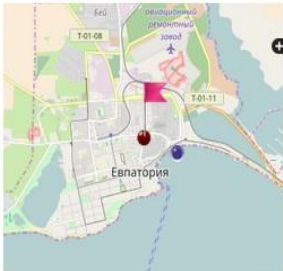

**Фотомониторинг**



14.09.2016 [Flagma.ua](#)

**Видеомониторинг**

данные последней версии отчета о ходе реализации мероприятий

# Отчет о ходе реализации мероприятия

**Ответственный исполнитель** размещает отчет о ходе реализации мероприятия в системе

**Отчет содержит** контрольные этапы реализации мероприятия, плановые и фактические даты исполнения, приложенные файлы.

Вся информация в системе имеет логическую связь для формирования аналитики и отчетности.

Принято

Версия: рабочая, номер: 18

Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП

Код ФЦП..... Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"

Наименование объекта..... Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым

строительства мероприятия ФЦП

Общие сведения


Дата формирования отчета..... 11.10.2016

Ответственный исполнитель..... Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ"

Муниципальное образование..... городской округ Евпатория

Главный распорядитель бюджетных средств..... Министерство экономического развития России

Тип объекта..... Линейные объекты

| Параметр                                           | План       | Налич.                              | Приложенные файлы                                                                   | Номер        | Дата получения документа | Организация, выдавшая документ | Комментарий | Связанные документы        |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| Статус выдачи ГПЗУ                                 | 01.09.2016 | <input checked="" type="checkbox"/> |  | RU93304000-1 | 19.09.2016               |                                |             | RU93304000-1 от 19.09.2016 |
| Техническое задание на объект ФЦП выдано/не выдано | 23.10.2016 | <input type="checkbox"/>            |                                                                                     |              |                          |                                |             |                            |

Статус землеотведения

| Параметр                                                    | План       | Налич.                              | Приложенные файлы | Номер | Дата получения документа | Организация, выдавшая документ | Комментарий | Связанные документы |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| Исходные данные получены                                    | 15.11.2016 | <input checked="" type="checkbox"/> |                   |       | 20.09.2016               |                                |             |                     |
| Иницирован процесс выбора подрядчика                        | 21.11.2016 | <input type="checkbox"/>            |                   |       |                          |                                |             |                     |
| Подрядчик выбран                                            | 30.11.2016 | <input checked="" type="checkbox"/> |                   |       | 30.11.2016               |                                |             |                     |
| Договор с подрядчиком заключен                              | 12.12.2016 | <input type="checkbox"/>            |                   |       |                          |                                |             |                     |
| Разработана схема расположения, карта (план)                | 16.01.2017 | <input type="checkbox"/>            |                   |       |                          |                                |             |                     |
| Согласование карты (плана)                                  | 31.01.2017 | <input type="checkbox"/>            |                   |       |                          |                                |             |                     |
| Приказ Министерства по имущественным и земельным отношениям | 01.02.2017 | <input type="checkbox"/>            |                   |       |                          |                                |             |                     |
| Внесен в реестр                                             |            |                                     |                   |       |                          |                                |             |                     |

Статус проектирования

| Параметр                                | План |
|-----------------------------------------|------|
| ТЗ на проектирование (выдано/не выдано) |      |
| Иницирован процесс выбора подрядчика    |      |
| Подрядная организация выбрана           |      |

Статус землеотведения

| Параметр                             | План       |
|--------------------------------------|------------|
| Исходные данные получены             | 15.11.2016 |
| Иницирован процесс выбора подрядчика | 21.11.2016 |
| Подрядчик выбран                     | 30.11.2016 |

# Представление детализированной отчетности по этапам

| Отчеты о ходе реализации мероприятий по этапам |                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                      |                            |                  |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Найдено — 3                                    |                                                                                                                                | Таблица                                                 | Расширенный поиск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                      |                            |                  |                |
|                                                | Объект строительства                                                                                                           | Отчет                                                   | Этап реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Плановая дата                                                                                                                                          | Отклонение                                                               | Дата исполнения                                      | Исполнитель                | Контроль отчета  | Статус отчета  |
|                                                | <a href="#">Водоснабжение сел. Разерное и Гонимовское, 1-я очередь</a>                                                         | <a href="#">Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП</a> | Иницирован процесс выбора подрядчика<br>Подрядчик выбран<br>Исходные данные получены<br>Статус выдачи ГПЗУ<br>Разработана схема расположения, карта (план)<br>Договор с подрядчиком заключен<br>Оформление завершено<br>ТЗ на проектирование (выдано/не выдано)<br>Иницирован процесс выбора подрядчика ПИР<br>Подрядная организация выбрана                                                       | 01.09.2016<br>28.09.2016<br>01.10.2016<br>01.10.2016                                                                                                   | 21 дн.<br>9 дн.<br>22 дн.<br>1 дн.                                       | 22.09.2016<br>30.09.2016<br>23.10.2016<br>30.09.2016 | ООО "ТАРАНТ"               | Денисов В. / Нет | Есть замечания |
|                                                | <a href="#">Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым</a> | <a href="#">Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП</a> | Исходные данные получены<br>Статус выдачи ГПЗУ<br>Техническое задание на объект ФЦП выдано/не выдано<br>Иницирован процесс выбора подрядчика<br>Подрядчик выбран<br>Разработана схема расположения, карта (план)<br>Договор с подрядчиком заключен<br>Оформление завершено<br>ТЗ на проектирование (выдано/не выдано)<br>Иницирован процесс выбора подрядчика ПИР<br>Подрядная организация выбрана | 01.09.2016<br>20.09.2016<br>04.10.2016<br>07.10.2016<br>18.10.2016<br>24.10.2016<br>31.10.2016<br>01.11.2016<br>07.11.2016<br>21.11.2016<br>28.11.2016 | 68 дн.<br>9 дн.<br>35 дн.<br>21 дн.<br>15 дн.<br>8 дн.<br>7 дн.<br>1 дн. | 29.09.2016<br>07.10.2016                             | ООО "Тестовая организация" | Азарева А. / Да  | Принято        |
|                                                | <a href="#">Многоэтапный автомобильный пункт пропуска Джанкой-Джанкойский район, Республика Крым</a>                           | <a href="#">Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП</a> | Исходные данные получены<br>Статус выдачи ГПЗУ<br>Техническое задание на объект ФЦП выдано/не выдано<br>Иницирован процесс выбора подрядчика<br>Подрядчик выбран<br>Разработана схема расположения, карта (план)<br>Договор с подрядчиком заключен<br>Оформление завершено<br>ТЗ на проектирование (выдано/не выдано)<br>Иницирован процесс выбора подрядчика ПИР<br>Подрядная организация выбрана | 01.09.2016<br>20.09.2016<br>04.10.2016<br>07.10.2016<br>18.10.2016<br>24.10.2016<br>31.10.2016<br>01.11.2016<br>07.11.2016<br>21.11.2016<br>28.11.2016 | 68 дн.<br>9 дн.<br>35 дн.<br>21 дн.<br>15 дн.<br>8 дн.<br>7 дн.<br>1 дн. | 29.09.2016<br>07.10.2016                             | ООО "Тестовая организация" | Азарева А. / Да  | Принято        |

## Цветовая индикация

### этапов:

- красный – просрочен, с указанием количества дней просрочку внутри круга;
- оранжевый – срок истекает (осталось меньше, либо равно 5 дней), с указанием количества оставшихся дней;
- светло-зеленый – закрыт досрочно;
- темно-зеленый – закрыт в срок;
- серый – срок исполнения больше текущей даты более чем на 5 дней.

Витрина данных может быть использована как для оперативного ведения информации, так и для контроля исполнения этапов.

На витрине отображаются только записи по объектам строительства из отчетов «своей» организации по Ответственным исполнителям.

# Быстрый доступ к информации по первоочередным объектам контроля

| Первоочередные объекты контроля |                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                    |                                           |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Найдено — 2                     |                                                                                                                                | Таблица                                                                                       |                                                                                                                                                        | Расширенный поиск                                  |                                           |                            |
|                                 | Объект строительства                                                                                                           | Направление и блок мероприятий                                                                | Незавершенные этапы реализации с просрочкой                                                                                                            | С истекающим сроком (осталось не более чем 5 дней) | Завершенные этапы реализации с просрочкой | Исполнитель                |
|                                 | <a href="#">Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым</a> | Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий                                | Техническое задание на объект ФЦП<br>выдано/не выдано - 16 дн.                                                                                         |                                                    | Статус выдачи ГПЗУ - 18 дн.               | ООО "ГАРАНТ"               |
|                                 | <a href="#">Многосторонний автомобильный пункт пропуска Джанкой, Джанкойский район, Республика Крым</a>                        | Мероприятия, направленные на обустройство пунктов пропуска на территории Российской Федерации | Исходные данные получены - 68 дн.<br>ТЗ на проектирование (выдано/не выдано) - 1 дн.<br>Техническое задание на объект ФЦП<br>выдано/не выдано - 35 дн. |                                                    | Статус выдачи ГПЗУ - 9 дн.                | ООО "Тестовая организация" |

| Незавершенные этапы реализации с просрочкой                                                                                                                                                                                            | С истекающим сроком (осталось не более чем 5 дней)                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Техническое задание на объект ФЦП<br>выдано/не выдано - 16 дн.                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| Исходные данные получены - 68 дн.<br>Техническое задание на объект ФЦП<br>выдано/не выдано - 35 дн.<br>Подрядчик выбран - 21 дн.<br>Договор с подрядчиком заключен - 8 дн.<br>Разработана схема расположения, карта<br>(план) - 15 дн. | ТЗ на проектирование (выдано/не выдано) - 2 дн.<br>Оформление завершено - 0 дн. |

Контроль просрочки  
плановой даты исполнения  
по этапам

Контроль «приближения»  
плановой даты исполнения  
по этапам

# Сводный отчет по исполнению мероприятий

Содержит обобщенную статистическую информацию по исполнению этапов из Отчетов о ходе реализации

| Сводный отчет по исполнению мероприятий                                           |                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Застройщик                                                                        | <input type="text"/>                                                                                                   | Всего объектов: 800                                                                            |                                                                           |
| Количество объектов завершено<br><small>(все этапы имеют дату завершения)</small> | Количество объектов не завершено в срок<br><small>(плановая дата этапов наступила и есть не завершённые этапы)</small> | Количество объектов в работе<br><small>(есть этапы плановая дата которых не наступила)</small> | Количество объектов без отчетов<br><small>(нет отчетов в системе)</small> |
| 120                                                                               | 300                                                                                                                    | 350                                                                                            | 30                                                                        |

Детализация данных отчета

ОЧИСТИТЬ

Количество объектов завершено  
120

Контрольный параметр, %  
просроченных этапов

25%

Контрольный параметр,  
количество дней  
просрочки

30

Без просрочки этапов

50

С просрочкой

< чем 25% этапов

30

< чем 30 дней

42

С просрочкой

> 25% этапов

40

> чем 30 дней

8

Область детализации заполняется при нажатии на цифру обобщенных сведений. Позволяет сразу получить дополнительную информацию по установленным контрольным параметрам.

# Формирование списка объектов по данным сводного отчета



| Застройщик        | Адрес и Наименование объекта                                                                               | Плановый год ввода | Фактическая дата ввода | Отчет по исполнению мероприятий                                     | Статус исполнения мероприятий |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ООО «ГАРАНТ»      | Перекладка аварийных сетей водопровода, г. Севастополь                                                     | 2016               | 30.08.2016             | Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП<br>Версия №6 от 01.09.2016  |                               |
| ООО «Тестировщик» | Магистральный газопровод Краснодарский край – Крым                                                         | 2015               | 30.11.2015             | Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП<br>Версия №10 от 01.12.2015 |                               |
| ООО «СтройЗаказ»  | Модернизация систем управления насосными станциями гидроузла N 3 в с. Штурмовое, 1-я очередь строительства | 2015               | 20.09.2015             | Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП<br>Версия №12 от 01.10.2015 |                               |

## Все объекты

Адрес или наименование

Найдено — 30 Таблица

| Адрес и наимено             | Столбцы         | Плановый год ввода |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Берегоукрепл. Республика Кр | Excel           | Плановый год ввода |
| Парк им. Фрунзе             | Параметры Excel | Плановый год ввода |

Осуществление выгрузки списка объектов в файл формата MS Excel

# Формирование календарного плана

## Календарный план поступления отчетов по объектам

Основное

### Общие сведения

\* Номер документа

1

Наименование документа

Календарный план поступления отчетов по объектам для организаций: ООО "ГАРАНТ"

\* категория объектов

Объект строительства

перечень объектов

\* роль участника по объекту

Застройщик

Объект строительства

Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым

Организация участник

Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ"

### План поступления документации

| Вид документа                             | Дата начала периода поступления документов | Контрольная дата поступления документа | Тип периода | Дата окончания цикла контроля |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП | 01.10.2016                                 | 05.10.2016                             | Неделя      | 01.11.2016                    |

## Календарный план

позволяет установить плановые сроки поступления контролируемых документов по объектам строительства

Можно установить начало планового срока, его длительность и периодичность, а также окончание цикла контроля.

Параметры контроля настраиваются

- на категорию объектов
- на роль организации
- на выбранный объект
- на подрядчика

# Уведомления по календарному плану

**Уведомления по объектам** автоматически направляются организациям в зависимости от параметров Календарного плана

**График рассылки** устанавливается заранее

**Рассылка выполняется** по электронной почте. Можно указать дополнительных получателей уведомлений.

### Настройка уведомлений по календарному плану

Основное Редакция Показатели Статусы Связанные документы Материалы

#### Основные сведения

\* Календарный план Календарный план поступления отчетов по объектам от 01.11.16 x

Номер календарного плана 1

Уведомление для категории объектов Объект строительства x

Уведомление для организаций назначенных на роль Застройщик x

Уведомление для объекта учета Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым x

Уведомление для организации - участника Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ" x

#### Настройка уведомлений для календарного плана

| Тип документа                               | Вид уведомления                                                      | Время отправки уведомления | Доп. уведомление участнику, назначенному на роль по указанной категории объектов | Пользователь системы, дополнительный получатель уведомления |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП x | За 1 день до наступления плановой даты x                             | 12:00 ⌚                    |                                                                                  | Азарова Анна; email rodinaeu@mdi.ru x                       |
| 2 Отчет о ходе реализации мероприятий ФЦП x | Проверка наличия и при отсутствии через 1 день после плановой даты x | 08:00 ⌚                    | Субподрядчик ⚙                                                                   |                                                             |

## Вид уведомления

За 1 день до наступления плановой даты x

Проверка наличия и при отсутствии через 1 день после плановой даты x

За 3 дня до наступления плановой даты x

За 5 дней до наступления плановой даты x

Проверка наличия и при отсутствии через 5 дней после плановой даты x

**Вид уведомления** – это выбор параметра из справочника для установки режима рассылки уведомлений

# Контроль исполнения календарного плана

Форма контроля в виде ежемесячного календаря

В форме контроля календарный месяц года разбит по дням

## Условные обозначения:

**Красный значок** – плановый срок размещения документа нарушен, документ не размещен

**Желтый значок** - плановый срок размещения документа нарушен, документ размещен с опозданием

**Зеленый значок** - плановый срок размещения документа выполнен, документ размещен в срок

**Цифра под значком** – количество документов попадающих в одну и ту же дату

